


Ponto de situação da implementação da SM1

27/08/2025

Investimento RE-C09-i01.01 – Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve

Medida SM1 – Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano

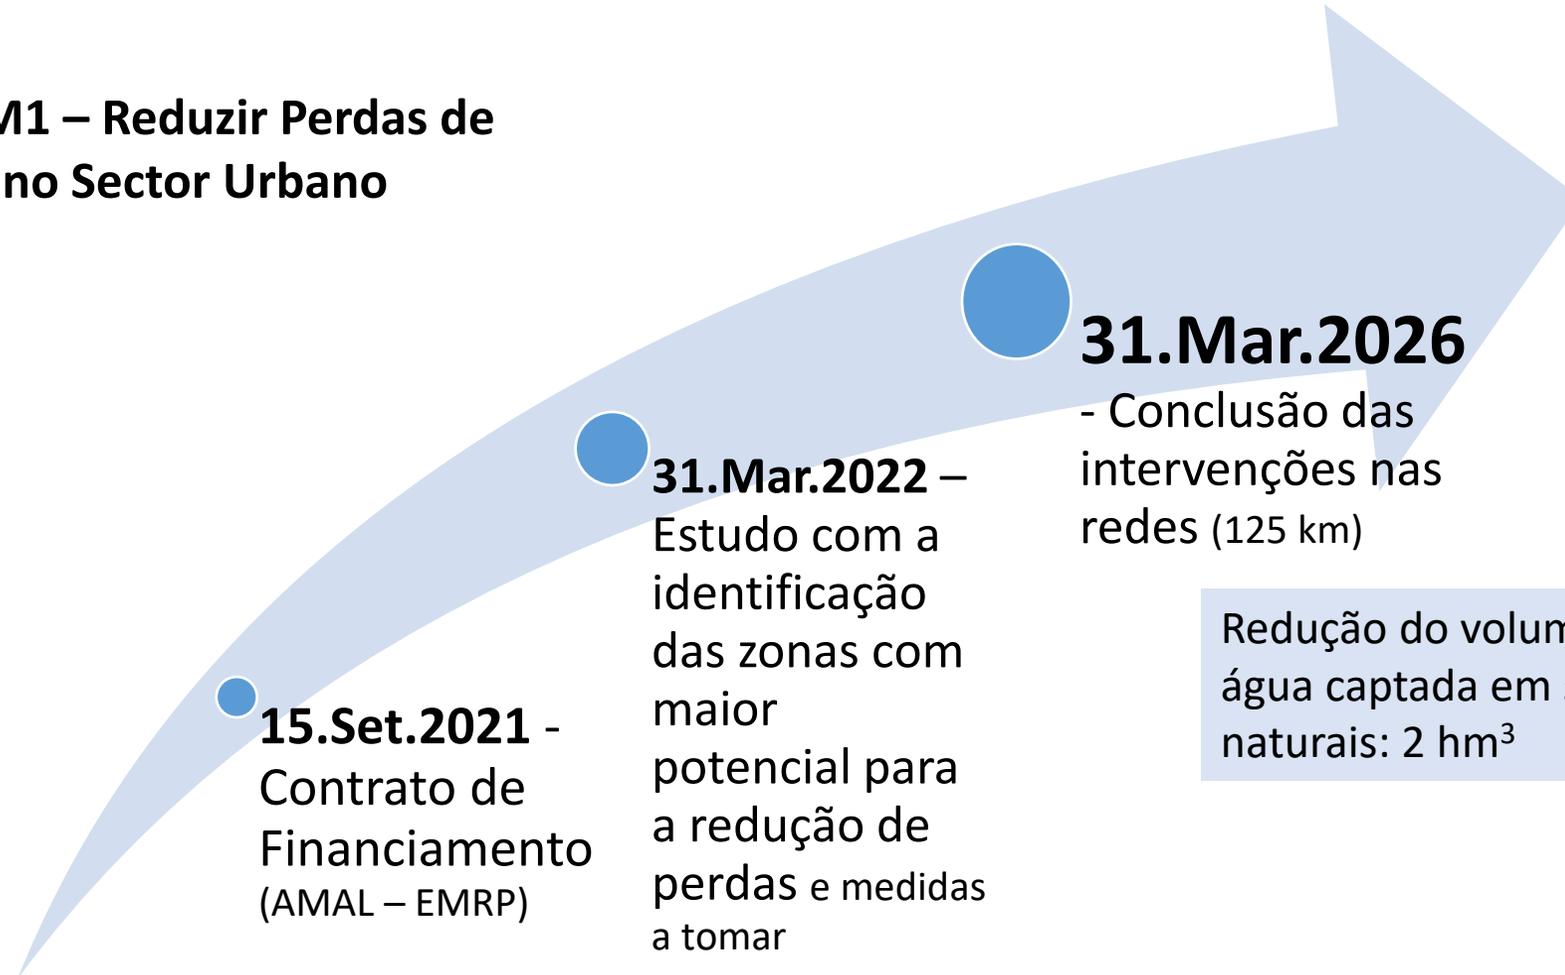

Dotação 43,9 (M€)

**Avisos Abertura Concurso (1.º, 2.º, 3.º e 4.º) →
8 Comissões de Gestão**

Aprovado

Invest. Elegível (M€)	60,1
Pago (M€)	20,0
N.º Candidaturas	62
N.º Empreitadas / Aquisições de serviços	199
Km	270
hm³	3,30

Investimento elegível, por grau de maturidade

em milhões de euros

Executado	Em execução	Em concurso	Por lançar	Total
15,3	24,5	19,1	1,2	60,1

Entidade Gestora	Invest. Eleg. (M€)
Albufeira	7,4
Alcoutim	1,0
Aljezur	3,9
Castro Marim	1,6
Faro – FAGAR	5,6
Lagoa	7,4
Lagos	8,4
Loulé	1,6
Inframoura	1,0
Infraquinta	0,0
Infralobo	0,0
Monchique	1,2
Olhão – Ambiolhão	4,5
Portimão – EMARP	0,2
S. Brás de Alportel	1,5
Silves	7,0
Tavira – Taviraverde	7,0
Vila do Bispo	0,7
V.R.S.A. – AdVRSA	0,0
Total	60,1

Execução financeira - Metas anuais

em milhões de euros

	2023	2024	2025	2026	Total
Previsto	6,0	12,0	10,0	15,9	43,9
Executado	4,5	6,8	9,2		20,5

Cumprimento das metas (previsional), por grau de maturidade

Indicador	Executado	Em execução	Em concurso	Por lançar	Total	Meta
Rede reabilitada (Km)	65,84	130,14	50,46	23,51	269,95	125
Poupança água (hm ³)	1,19	1,37	0,63	0,11	3,30	2
